


KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

Công trình: Đường vào Đồn 783, xã Đắk O, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước (Đoạn 2: Cầu và đường)
 Kèm theo Quyết định số 223 /QĐ-UBND ngày 23 /04/2009 của UBND tỉnh Bình Phước

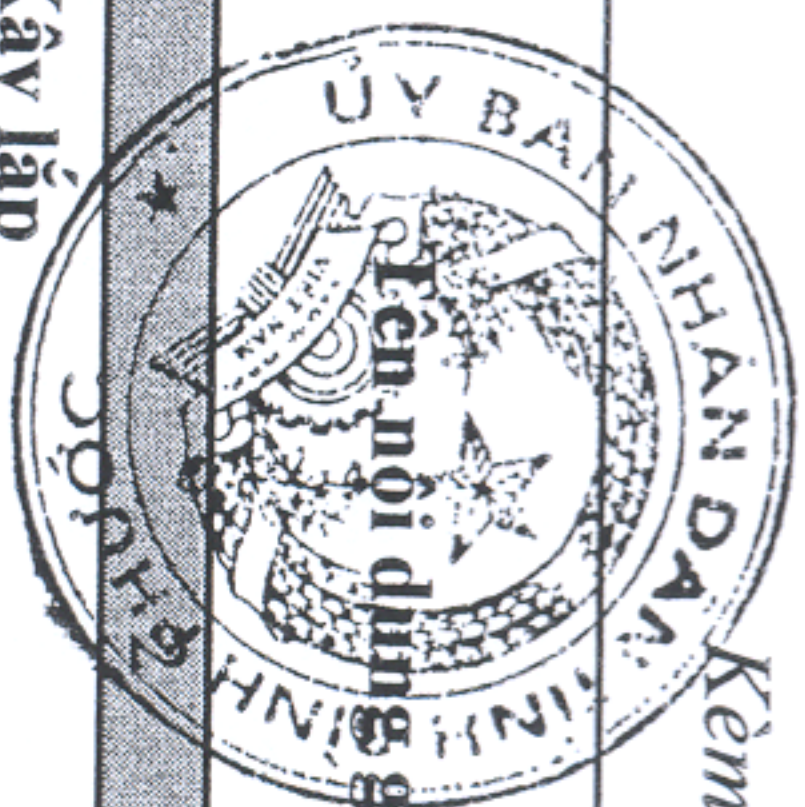

TT	Ghi nội dung gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		3	4	5	6	7	8	9
I	Xây lắp	11.269.550.022						
I	Xây lắp các hạng mục công trình	11.269.550.022	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi	Một túi hồ sơ	Năm 2009	Theo đơn giá điều chỉnh	250 ngày
II	Chi phí tư vấn khác	861.050.480						
1	Chi phí khảo sát địa chất	193.403.283	//	Chỉ định thầu	-	Năm 2008	Trọn gói	Đã thực hiện
2	Chi phí khảo sát, lập dự án	119.860.279	//	//	-	Năm 2008	Trọn gói	Đã thực hiện
3	Chi phí khảo sát, thiết kế BVTC	178.050.194	//	//		Năm 2008		Đã thực hiện
4	Chi phí lập HSMT và phân tích đánh giá HSMT	25.266.114	//	//	-	Năm 2009	Trọn gói	45 ngày
5	Chi phí Giám sát thi công	231.838.638	//	//	-	Năm 2009	Trọn gói	Theo thời gian thi công
6	Chi phí bảo hiểm xây dựng	23.754.444	//	//	-	Năm 2009	Trọn gói	Theo thời gian thi công
7	Chi phí kiểm toán công trình	7.734.005	//	//		Năm 2009	Trọn gói	45 ngày
8	Chi phí kiểm định chất lượng	81.143.523	//	//		Năm 2009	Trọn gói	45 ngày
III	Phần công việc không đầu thầu	1.494.898.436						
1	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	9.280.806	Ngân sách tỉnh	Theo quy định		Năm 2009-2010	Theo tỷ lệ %	30 ngày
3	Chi phí thẩm tra dự toán	11.704.174	//	//		Năm 2009	Theo tỷ lệ %	30 ngày
4	Chi phí thẩm tra dự án	2.010.451	//	//		Năm 2008	Theo tỷ lệ %	30 ngày
5	Chi phí thẩm tra bản vẽ thi công	12.035.632	//	//		Năm 2008	Theo tỷ lệ %	30 ngày
6	Chi phí Ban quản lý dự án	221.185.651	//	//		Năm 2009-2010	Theo tỷ lệ %	
7	Chi phí dự phòng	1.238.681.722	//	//			Theo tỷ lệ %	
	Tổng cộng: (I+II+III)	13.625.498.938						
